

**RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO****RVF/COFA/07/2022****Fiscalização ETA Valparaíso - Sistema Corumbá IV****Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE****1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA****ADASA:** Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.**Endereço:** Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.**Telefone:** (61) 3961-4900**2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS****CAESB** – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal**Endereço:** Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.**3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA**

<b>Tipo</b>	Vistoria da finalização das obras da ETA Valparaíso (SAA Corumbá IV)
<b>Localidade (s)</b>	Valparaíso - GO
<b>Data da ação fiscalizatória</b>	22 de março de 2022

**4. OBJETIVO**

O objetivo dessa ação foi vistoriar a conclusão das obras da ETA Valparaíso e obter informações sobre o início da pré-operação.

**5. METODOLOGIA**

A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu a visita à Estação de Tratamento de Água ETA Valparaíso, unidade do Sistema Corumbá IV, sendo a equipe da Adasa acompanhada pelo engenheiro da Caesb Wellington, da Superintendência de Produção de Água.

**6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO**

A equipe da Adasa vistoriou durante a visita as seguintes instalações da ETA Valparaíso (Figura 1): Sala de Supervisão e Controle (Controle Operacional) (Figura 2), Floculadores e Flotadores (Figura 3), Filtros (Figura 4), Unidade de Tratamento da Água de Lavagem dos Filtros (Figura 5), Centrifugas da Unidade de Tratamento da Água de Lavagem dos Filtros (Figura 6), Adutora de Entrada de Água Bruta (Figura 7) e Casa de Química (unidade de para preparo dos produtos químicos a serem dosados no tratamento da água) (Figura 8).



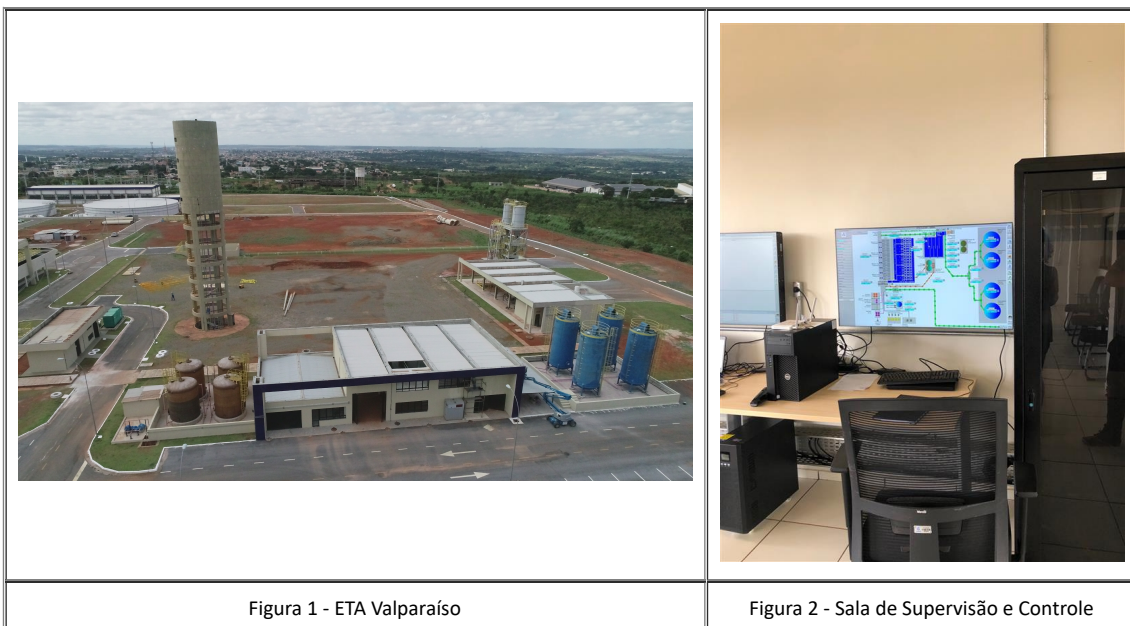


Figura 1 - ETA Valparaíso

Figura 2 - Sala de Supervisão e Controle

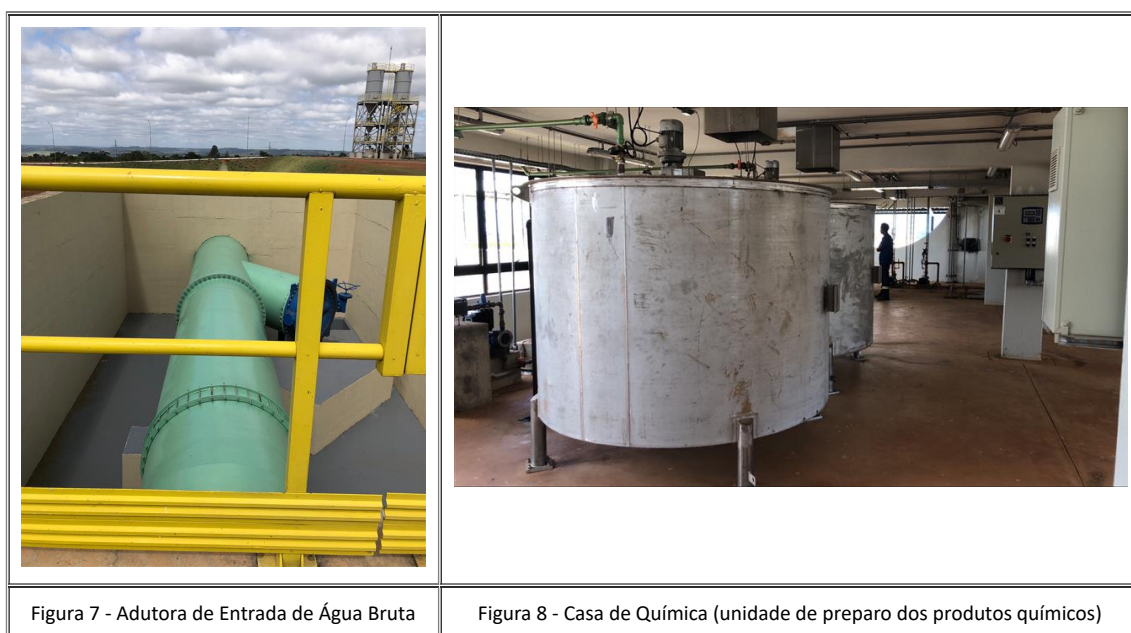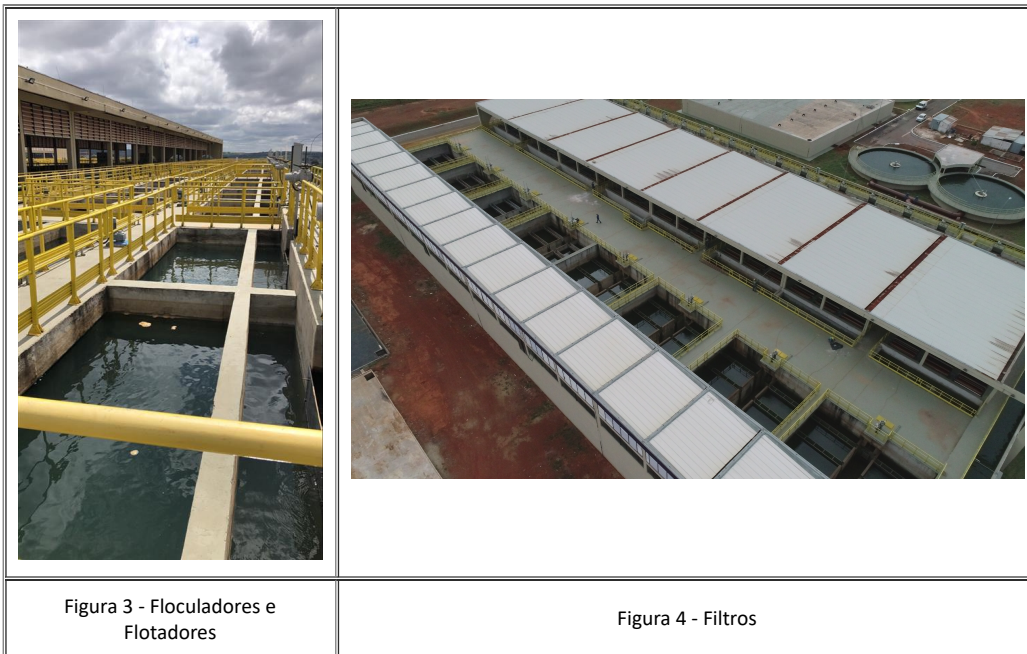

O engenheiro da Caesb que acompanhou a equipe apresentou as seguintes informações:

- Testes de bombeamento na Estação Elevatória de Água Bruta (EAB) e de tratamento na ETA iniciados em novembro de 2021.
- ETA em fase de pré-operação.

- Até o momento os testes foram realizados com uma vazão máxima de 1.400 L/s.
- Estão sendo realizados testes em 3 ou 4 dias da semana.
- Durante a visita da equipe da Adasa a ETA não estava em funcionamento, pois estavam sendo feitos ajustes que se verificaram necessários após o último teste.
- A Adutora de Água Tratada está em processo de enchimento para viabilizar a operação da Elevatória de Água Tratada, de forma a realizar os testes de envio de água para o Distrito Federal na próxima semana.

#### 7. CONCLUSÃO

A ETA Valparaíso encontra-se em fase de pré-operação, tendo executado testes até o momento com vazão de até 1.400 L/s.

Ajustes estão sendo realizados conforme verifica-se a necessidade durante os testes.

Ainda não foram realizados testes com a Adutora de Água Tratada, os quais estão previstos para ocorrer na próxima semana.

#### 8. EQUIPE TÉCNICA

##### **Adalto Clímaco Ribeiro**

Regulador de Serviços Públicos

##### **Welber Ferreira Alves**

Regulador de Serviços Públicos

##### **Natália Costa Vieira**

Estagiária

##### **Vinícius Mortari da Costa**

Estagiário



Documento assinado eletronicamente por **ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 08/04/2022, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WELBER FERREIRA ALVES - Matr.0198239-7, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 29/04/2022, às 10:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **82935141** código CRC= **07A39175**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Norte - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

3961-5034
