



ADASA

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL**

**Fiscalização de Acompanhamento referente às correções de não
conformidades encontradas no Sistema de Abastecimento de
Água de Brazlândia no ano de 2015**

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto – SAE

Brasília – DF

2016

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	3
4. OBJETIVO.....	3
5. METODOLOGIA.....	3
6. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	4
CAP.CON.001 - Captação Capão da Onça.....	4
CAP.BRC.001 – Captação Barrocoão.....	5
REL. IN8.001 – Reservatório Elevado.....	5
7. CONCLUSÃO.....	6
10. EQUIPE TÉCNICA.....	6

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo	Vistoria de Retorno aos locais do Relatório de Fiscalização/COFA/005/2015
Localidade(s)	Brazlândia
Data da Inspeção de campo.	05/04/2016

4. OBJETIVO

O objetivo dessa vistoria é verificar se as não conformidades encontradas pela fiscalização técnica operacional em relação aos requisitos de qualidade, eficiência e segurança foram sanadas.

Sendo assim, esse Relatório detalha a ação de Fiscalização de Retorno aos locais nos quais foram encontradas não conformidades e que a Caesb informa ter atendido as determinações expressas no Relatório de Fiscalização/COFA/005/2015.

5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu a ida aos locais os quais a Caesb informou ter sanado as não conformidades apontadas pelo relatório RF/COFA/005/2015.

A vistoria foi acompanhada sempre por algum supervisor ou operador da área que se encarregou de explicar quais as melhorias realizadas.

Os locais vistoriados e os apontamentos sobre o que necessitava ser trocado/reparado foram os seguintes:

C1 – Vazamentos:

- CAP.CON.001 - Na caixa de entrada da captação e na estrutura da barragem da captação.
- EAB.BRC.001 – Vazamento em válvula na caixa de saída de rede.
- REL. IN8.001 – Vazamento na base do reservatório.

6. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

CAP.CON.001 - Captação Capão da Onça

Foram realizados os reparos dos vazamentos na estrutura da barragem relacionados no RVF/COFA/005/2015. Entretanto, surgiu outro vazamento na estrutura da barragem. O técnico que acompanhou o retorno informou que já há programação pela Caesb para que os novos reparos sejam feitos.



Foto 1 – vazamento na estrutura da barragem de nível (RF/COFA/005/2015)



Foto 2 – Vazamento reparado na estrutura da barragem de nível.



Foto 3 – Vazamento na estrutura da barragem da CAP.CON.001 (RF/COFA/005/2015)



Foto 4 – Reparos de vazamentos realizados, porém apresenta novo vazamento.

CAP.BRC.001 – Captação Barroço

O vazamento na válvula da caixa de saída de rede foi reparado

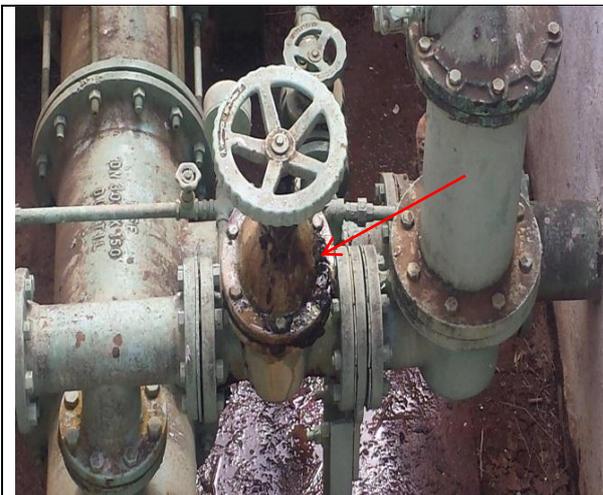


Foto 5 – vazamento em válvula da caixa de saída de rede. (RF/COFA/005/2015)



Foto 6 – vazamento reparado em válvula da caixa de saída de rede.

REL. IN8.001 – Reservatório Elevado

O Reservatório não apresenta mais indícios da existência de vazamentos, indicando que a Caesb sanou o vazamento.



Foto 7 – Chão molhado indicando possível vazamento (RF/COFA/005/2015)



Foto 8 – Reservatório elevado sem sinais de vazamento.

7. CONCLUSÃO

A vistoria teve o objetivo de verificar as ações corretivas realizadas pela Caesb quanto aos apontamentos realizados no RF/COFA/005/2015. Conforme constatado na descrição dos fatos levantados, os reparos informados pela Concessionária foram realizados, sendo então considerados sanados, quanto ao novo vazamento na estrutura da barragem da CAP.CON.001, será objeto de acompanhamento e nova fiscalização de acordo com novo cronograma que deverá ser encaminhado pela Concessionária. De forma que o processo referente ao RF/COFA/005/2015 permanece aberto até a conclusão final do trabalho.

10. EQUIPE TÉCNICA

Igor Medeiros da Silva

Coordenador de Fiscalização

Rossana Santos de Castro

Reguladora de Serviços Públicos

Daniel de Lucena Matos

Regulador de Serviços Públicos

Brasília, DF, 02 de maio de 2016
